SICEP di Baldi Simone e Polenta Ruggero snc
Viale della Repubblica, 40
Santa Maria Nuova (AN)

Rifer. 4-10-4-1

PROVA PENETROMETRICA STATICA
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA

CPT 2

2.01PG05-062

- committente : MNR Immobiliare S.r.l.
- lavoro : Pian di Rose
- località : Sant'Ippolito
- note :

- data : 04/10/2004
- quota inizio : Piano Campagna
- prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1

Prof. m	Letture di campagna punta	laterale	qc kg/cm²	fs	qc/fs
0,20	----	----	--	------	----
0,40	----	----	--	1,60	----
0,60	12,0	36,0	12,0	1,53	8,0
0,80	47,0	70,0	47,0	3,67	13,0
1,00	42,0	97,0	42,0	3,47	12,0
1,20	55,0	107,0	55,0	5,13	11,0
1,40	40,0	117,0	40,0	3,27	12,0
1,60	43,0	92,0	43,0	3,07	14,0
1,80	43,0	89,0	43,0	2,87	15,0
2,00	38,0	81,0	38,0	2,53	15,0
2,20	33,0	71,0	33,0	1,93	17,0
2,40	32,0	61,0	32,0	2,07	15,0
2,60	30,0	61,0	30,0	1,67	18,0
2,80	28,0	53,0	28,0	2,13	13,0
3,00	29,0	61,0	29,0	1,20	24,0
3,20	24,0	42,0	24,0	1,20	20,0
3,40	28,0	46,0	28,0	1,33	21,0
3,60	39,0	59,0	39,0	1,73	22,0
3,80	37,0	63,0	37,0	1,67	22,0
4,00	39,0	64,0	39,0	1,80	22,0
4,20	30,0	57,0	30,0	1,33	22,0
4,40	24,0	44,0	24,0	0,73	33,0
4,60	33,0	44,0	33,0	1,33	25,0
4,80	32,0	52,0	32,0	1,47	22,0
5,00	27,0	49,0	27,0	1,60	17,0
5,20	25,0	49,0	25,0	1,00	25,0
5,40	34,0	49,0	34,0	1,67	20,0
5,60	39,0	64,0	39,0	1,73	22,0
5,80	43,0	69,0	43,0	2,00	22,0
6,00	45,0	75,0	45,0	2,20	20,0
6,20	36,0	69,0	36,0	2,33	15,0
6,40	30,0	65,0	30,0	1,33	22,0
6,60	31,0	51,0	31,0	2,00	16,0
6,80	32,0	62,0	32,0	1,93	17,0
7,00	32,0	61,0	32,0	1,47	22,0
7,20	37,0	59,0	37,0	2,73	14,0
7,40	40,0	81,0	40,0	2,67	15,0
7,60	38,0	78,0	38,0	2,80	14,0
7,80	46,0	88,0	46,0	2,80	16,0
8,00	31,0	73,0	31,0	1,20	26,0
8,20	27,0	45,0	27,0	1,00	27,0
8,40	28,0	43,0	28,0	1,47	19,0
8,60	37,0	59,0	37,0	-----	----

- PENETROMETRO STATICO tipo PAGANI da 10/20t
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct = 10 - Velocità Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann ø = 35.7 mm (area punta 10 cm² - apertura 60°)
- manicotto laterale (superficie 150 cm²)

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

SICEP di Baldi Simone e Polenta Ruggero snc
Viale della Repubblica, 40
Santa Maria Nuova (AN)

Rifer. 4-10-4-1


PROVA PENETROMETRICA STATICA
DIAGRAMMA DI RESISTENZA

CPT 2

2.01PG05-062

- committente : MNR Immobiliare S.r.l.
- lavoro : Pian di Rose
- località : Sant'Ippolito

- data : 04/10/2004
- quota inizio : Piano Campagna
- prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1 : 100

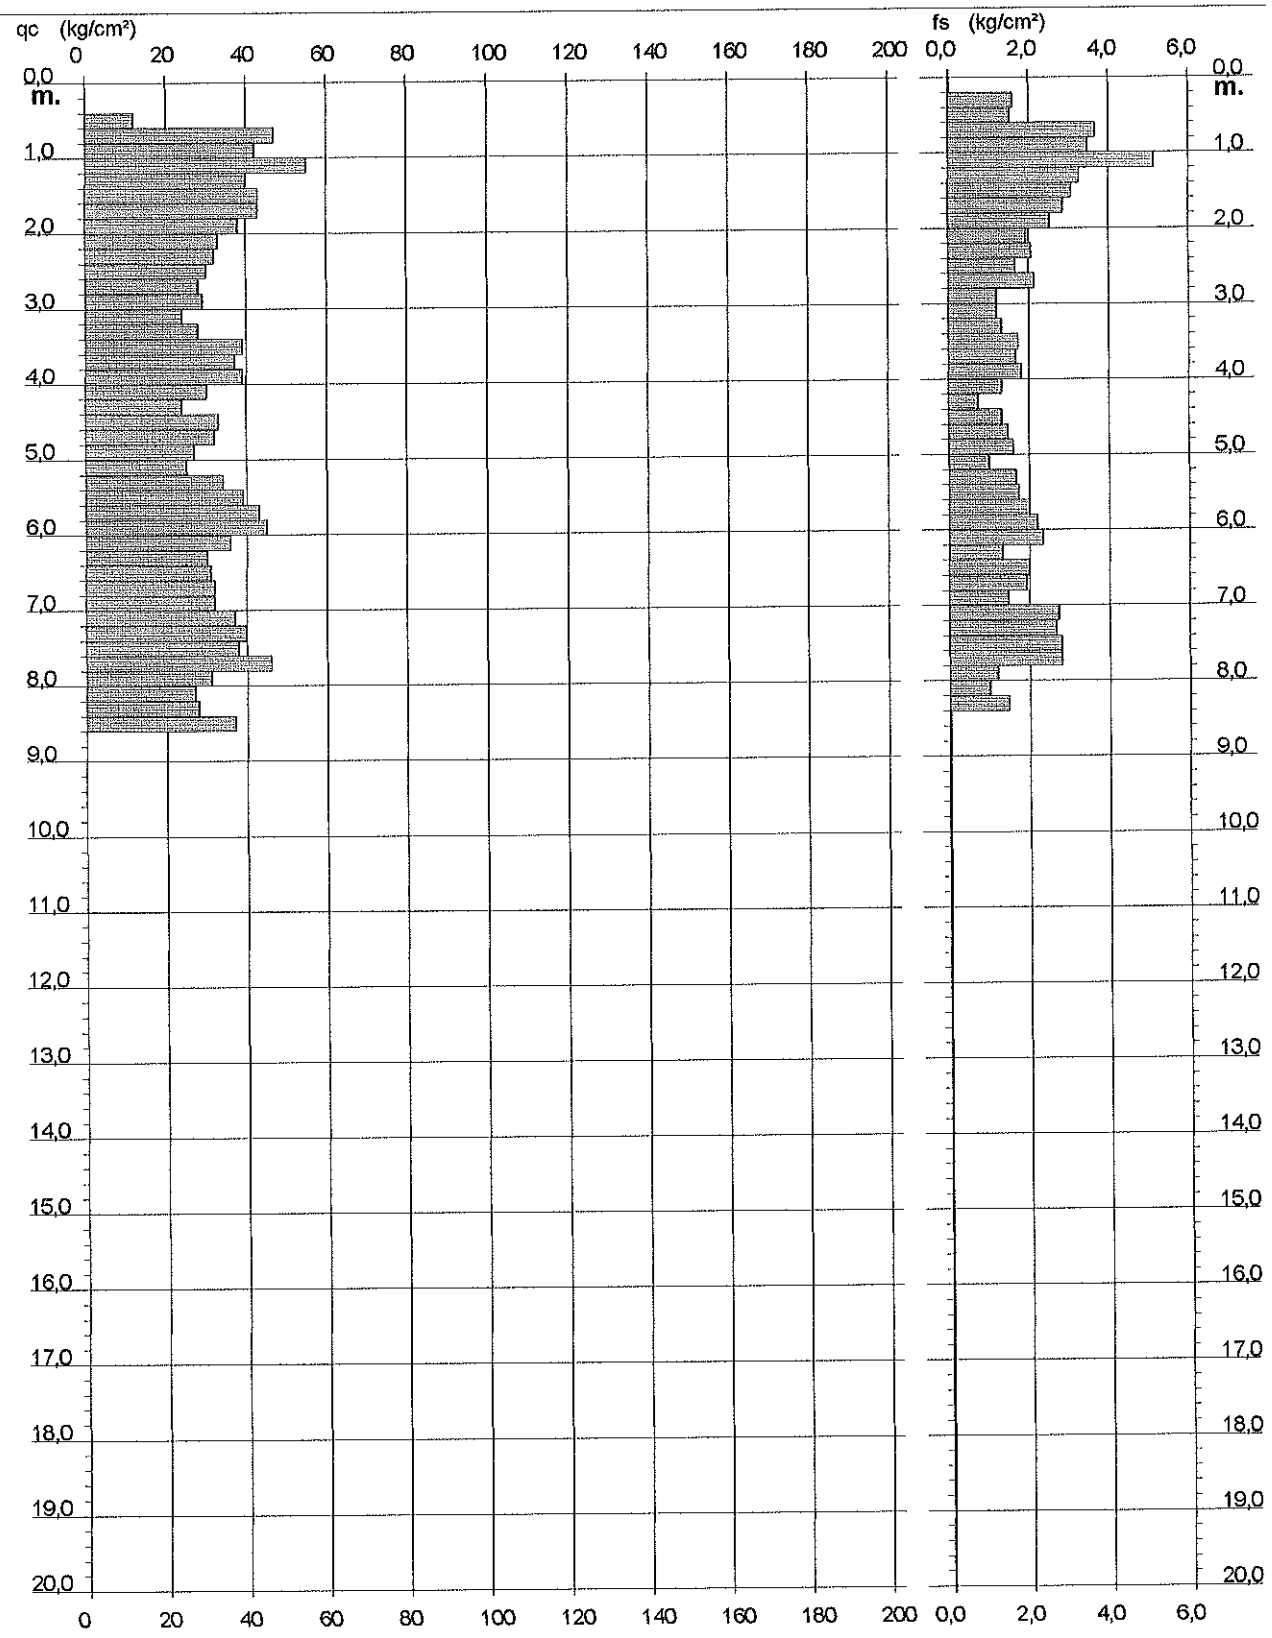

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820
